

Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta  
“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”  
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/17/I/021)  
īstenošanas statusu

**Projekta nosaukums:** Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)

**Projekta ieviešanas periods:** 30.11.2017. – 29.08.2020.

**Saņēmējs:** Būvniecības valsts kontroles birojs

**Projekta partneri:** IZM, VRAA, TA, VZD, EM, LVRTC

**Ziņojums par periodu:** 01.01.2020.-31.03.2020.

### 1. Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis	Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta mērķis	<ol style="list-style-type: none"><li>Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām:<ul style="list-style-type: none"><li>- nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, tādējādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku;</li><li>- pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos datus un tādējādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem.</li></ul></li><li>Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana:<ul style="list-style-type: none"><li>- samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts IS;</li><li>- samazinot papīra dokumentu apripi;</li><li>- pilnveidojot Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) saskarnes ar valsts IS.</li></ul></li><li>Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums:<ul style="list-style-type: none"><li>- popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību;</li><li>- nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību;</li><li>- paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas.</li></ul></li></ol>



## 2. Projekta ieviešanas gaita

Projekta aktiv. Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts	Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1.	Projekta vadība un īstenošana	Īstenots projekts		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 10 (no tām pārskata periodā 0) Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 11 (no tām pārskata periodā 1) Projekta valdes sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 106 (no tām pārskata periodā 15) Projekta vadības darba grupas sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 106 (no tām pārskata periodā 12) projekta komandas sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 149 (no tām pārskata periodā 7) projekta darba grupas.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā sagatavoti 10 (no tām pārskata periodā 1) Maksājumu pieprasījumi.</li> </ul>
2.	Projekta apraksta sagatavošana	Sagatavots projekta apraksts	Sagatavots projekta apraksts	Noslēgts līgums ar SIA Ernst&Young par projekta apraksta sagatavošanu. <b><i>Apraksts sagatavots, aktivitāte īstenota.</i></b>
3.	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole			
3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde un biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde	Sagatavotas 7 tehniskās specifikācijas.	Izstrādātas 7 tehniskās specifikācijas	Noslēgts līgums ar AA Projekts. Projekta ietvaros kopā izstrādātas 7 tehniskās specifikācijas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveidei;</li> <li>2) Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesa pilnveidei;</li> <li>3) Būvniecības procesa uzraudzības pilnveidei;</li> <li>4) Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveidei;</li> <li>5) Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveidei;</li> <li>6) Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveidei;</li> </ul>



				7) Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanai. <b><i>Tehniskās specifikācijas izstrādātas, aktivitāte īstenota.</i></b>
3.2.	Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole	Nodrošināta informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontrole	106 sanāksmes 30 kvalitātes kontroles ziņojumi	Līdz šim projekta ietvaros organizētas 106 sanāksmes informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 15 sanāksmes. Sagatavoti 30 ziņojumi par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, no tiem 3 ziņojumi pārskata periodā.
4.	Informācijas sistēmas pilnveide			
4.1.	Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Ieviests produkcijā process “Būvkomersantu klasifikācijas process”. Būvniecības informācijas sistēmā ir realizēti divi e-pakalpojumi: 1) Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu; (jauns e-pakalpojums); 2) Dati no būvkomersantu reģistra; (papildināts esošs e-pakalpojums). <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.</i></b> <b><i>Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.2.	Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Ieviests produkcijā process "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide". Būvniecības informācijas sistēmā ir realizēti divi e-pakalpojumi: 1) "Elektroniska būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana" (papildināts esošs e-pakalpojums); 2) "Atgādinājumu saņemšana"; (jauns e-pakalpojums). <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.</i></b> <b><i>Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.3.	Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Ieviests produkcijā process “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide”. Pilnveidojumi BIS produkcijā pieejami ar 2019.gada 1.oktobri. <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota.</i></b> <b><i>Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.4.	Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Ieviests produkcijā process “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide”. Pilnveidojumi BIS produkcijā pieejami ar 2019.gada 1.oktobri.



				<b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota. Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.5.	Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Funkcionalitātes izstrādes darbi pabeigti. <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota. Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.6.	Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Izstrādāta tehniskā specifikācija un uzsākti funkcionalitātes izstrādes darbi. <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota. Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
4.7.	Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana	Pilnveidots 1 process	Pilnveidots 1 process	Izstrādāta tehniskā specifikācija un uzsākti funkcionalitātes izstrādes darbi. <b><i>Process pilnveidots, aktivitāte īstenota. Funkcionalitāte pieejama produkcijā.</i></b>
5.	Datu migrācija uz vienotu valsts datu centru	Datu izmitināšana vienotā datu izmitināšanas centrā	Dati izmitināti vienotā datu izmitināšanas centrā	Veikta Būvniecības informācijas sistēmas testa un produkcijas vides migrācija no EM uz LVRTC infrastruktūru. Noslēgts jumta līgums ar BVKB un LVRTC par infrastruktūras pakalpojumu sniegšanu. <b><i>Datu migrācija veikta, aktivitāte īstenota.</i></b>
6.	Informācijas sistēmas drošības audits	4 audita ziņojumi	3 audita ziņojumi	Veikts audita 1.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības drošības un “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide” pilnveidoto funkcionalitāti. Augsta riska atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus, <u>netika</u> konstatēti. Veikts audita 2.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības drošības un “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” pilnveidoto funkcionalitāti. Augsta riska atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus, <u>netika</u> konstatēti. Veikts audita 3.posms un sagatavots ziņojums par BIS lietojamības drošības un “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide” pilnveidoto funkcionalitāti. Augsta riska atklājumi, kas rada būtiskus drošības riskus, <u>netika</u> konstatēti. Pasūtīts audits 4.posmam. Audits ziņojums tiks iesniegts aprīlī.



7.	Apmācību un informatīvo materiālu nodrošināšana			
7.1.	Informatīvo materiālu nodrošināšana	Izstrādāts vai pilnveidots informatīvais materiāls	8 gab.	<p>Izstrādāti un pilnveidoti informatīvie materiāli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide”.</li> <li>2. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide”</li> <li>3. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide”</li> <li>4. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide”</li> <li>5. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”.</li> <li>6. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide”.</li> <li>7. Pilnveidotas programmatūras lietotāja lietošanas atbalsta materiāli “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana”.</li> <li>8. Pilnveidota BIS Administratoru rokasgrāmata.</li> </ol>
7.2.	Apmācības	Nodrošinātas apmācības 300 cilv.	1019 cilv.	<p>Birojs kopumā par BIS funkcionalitāti ir apmācījis <b>12 685</b> personas, organizējot <b>313</b> pasākumus (no tām ERAF projekta ietvaros <b>1019</b> būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas speciālisti projekta ietvaros un citi sistēmas lietotāji, organizējot <b>64</b> apmācības datorklasēs).</p> <p>Ziņojuma pārskata periodā (1.01.2020.-30.03.2020.) Birojs kopumā par BIS funkcionalitāti ir apmācījis <b>177</b> personas, organizējot <b>13</b> apmācības datorklasēs.</p> <p>Izstrādātie apmācību materiāli, video rullīši un tiešraides ieraksti par jauno funkcionalitāti pieejami BVKB mājas lapā</p>



				<p><a href="http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari">http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari</a> un BIS portālā (saite darbojas pēc autorizācijas BIS portālā) <a href="https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/projekta-aktivitates-un-macibas">https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/projekta-aktivitates-un-macibas</a> un BVKB Yotube kontā: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber">https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber</a></p>
8.	Publicitāte	Preses relīzes	Pārskata periodā 3	<p>1.1.Uzzini par BIS lietošanu valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (10.01.2020.) <a href="https://bvkb.gov.lv/lv/news/uzzini-par-bis-lietosanu-valsts-un-pasvaldibu-vienotajos-klientu-apkalposanas-centros">https://bvkb.gov.lv/lv/news/uzzini-par-bis-lietosanu-valsts-un-pasvaldibu-vienotajos-klientu-apkalposanas-centros</a></p> <p>1.2. Pieejamas jaunākās video pamācības BIS lietošanā (21.01.2020.) <a href="https://bvkb.gov.lv/lv/news/pieejamas-jaunakas-video-pamacibas-bis-lietosana">https://bvkb.gov.lv/lv/news/pieejamas-jaunakas-video-pamacibas-bis-lietosana</a></p> <p>1.3. Dalība izstādē “Māja I 2020” <a href="https://bis.gov.lv/bisp/news/izstades-maja-i-laika-informes-par-aktualitatem-eku-renovacija-un-kvalitativu-buvniecibu-5090cd27-37d0-4486-979f-d2783614d30e">https://bis.gov.lv/bisp/news/izstades-maja-i-laika-informes-par-aktualitatem-eku-renovacija-un-kvalitativu-buvniecibu-5090cd27-37d0-4486-979f-d2783614d30e</a></p>

### **3. Projekta 4.laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide” pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un statistika**

4.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 4 projekta darba grupas, kurās tiek definētas prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 4.laidienam ir piedalījušies 74 pārstāvji, pārstāvot 14 institūcijas.

4.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 2 sprintos. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama produkcijā. Pilnveidots esošais process - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu pārvaldība, nodrošinot iespēju patstāvīgas prakses sertifikātam arhitektūras un būvniecības jomā norādīt informāciju par izglītību un prakses vietu no esošajiem valsts reģistriem, ja tā tur reģistrēta. Tāpat BIS publiskajā portālā ieviesta iespēja veikt būvspeciālistu sertificēšanas institūcijas pakalpojuma apmaksu, kā arī iesniegt un izvērtēt speciālistu elektroniskos iesniegumus. Pilnveidots speciālistu pārbaudes process.

### **4. Projekta 5.laidiena “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide” pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un statistika**

5.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 7 projekta darba grupas, kurās tiek definētas prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 5.laidienam ir piedalījušies 51 pārstāvji, pārstāvot 11 institūcijas.

5.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 2 sprintos. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama produkcijā. Pilnveidots ēku energoefektivitātes pārvaldības process, izstrādājot ēku energoefektivitātes pārvaldības atbalsta moduli, kas nodrošinās energoauditoru reģistrēšanas funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī reģistrā iekļauto energoauditoru lomu un tiesību konfigurēšanu un administrēšanu. Tiek nodrošināta energoaudītu reģistrēšana, veidojot vienotu uzņēmumu energoaudītu uzskaiti un pārvaldību.

### **5. Projekta 6.laidiena “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana” pilnveidotās funkcionalitātes izstrādes gaita un statistika**

6.laidiena funkcionalitātes pilnveidei notikušas 5 projekta darba grupas, kurās tiek definētas prasības, veikti pilnveides darbi, nodrošināta demonstrēšana. Darba grupās kopumā 6.laidienam ir piedalījušies 47 pārstāvji, pārstāvot 12 institūcijas.

6.laidiena ietvaros veicamie darbi tika sadalīti 1 sprintā. Funkcionalitāte izstrādāta un pieejama produkcijā. Lai nodrošinātu būvniecības procesā iesaistīto personu, kā arī tādu tirgus dalībnieku kā importētāju, izplatītāju un ražotāju informētību par prasībām būvizstrādājumu jomā, ir pilnveidots esošais process, nodrošinot elektronisku būvizstrādājumu atbilstības prasību (standartu) raksturojošās informācijas uzturēšanu BIS. Kā arī radīts jauns publisks pakalpojums *Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra*, visai būvniecības nozarei nodrošinot ērtu piekļuvi informācijai par būvizstrādājumu atbilstības prasībām.

Vienota, pārskatāma būvizstrādājumu atbilstības prasību platforma pozitīvi ietekmēs būvniecības nozari kopumā, aizsargājot un informējot patērētāju par Latvijas tirgū atļautajiem būvizstrādājumiem, to paredzētajiem pielietojumiem un atbilstību būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām.

## 6. Papildus veiktie BIS pilnveides darbi

Izstrādāts process datu apmaiņai starp BIS un Kadastru par jaunbūves reģistrēšanu, būves nodošanu ekspluatācijā vai dzēšanu un lietošanas veida maiņu. Izstrādāts arī risinājums, lai personai būtu iespēja veikt nepieciešamās darbības vienā sistēmā, caur BIS izveidot iesniegumu būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, kas automātiski izveidotu pieprasījumu Kadastram kā kadastrālais uzmērīšanas pieprasījums.

## 7. Informatīvie semināri un apmācības

Pārskata periodā apmācīti 177 dalībnieki (146 dalībnieki 2.,3.laidiens, 4.laidiens 16 dalībnieki, 5.laidiens 8 dalībnieki, 6.laidiens 7 dalībnieki).

Visi apmācību materiāli un video ieraksti ir pieejami BIS portālā <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas>, tādējādi arī citi interesenti, kuri nepiedalījās klātienē apmācībās, var ērti iepazīties un apgūt sistēmas funkcionalitāti.

Šī gada decembra beigās būs ieejams arī vebināru ieraksts BIS portālā.


## 8. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks

Nākamajā periodā (2020.gada II.ceturksnis) plānota organizēt 12 apmācību pasākumus būvvaldēm un iestādēm, kas pilda būvvaldes funkciju par BIS funkcionalitāti kopumā. Sākotnēji tika plānotas klātienē apmācības datorklasēs, taču ņemot vērā ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar CoVid2019 pandēmiju, apmācības tiks organizētas tiešsaistē.

Plānoto projekta ietvaros būvniecības procesu funkcionalitātes pilnveides darbi ir pabeigti. Notiek BIS lietotāju dokumentāciju caurskatīšana un saskaņošana, kas plānota arī nākamajā ceturksnī.



## Aktivitāšu ieviešanas grafiks

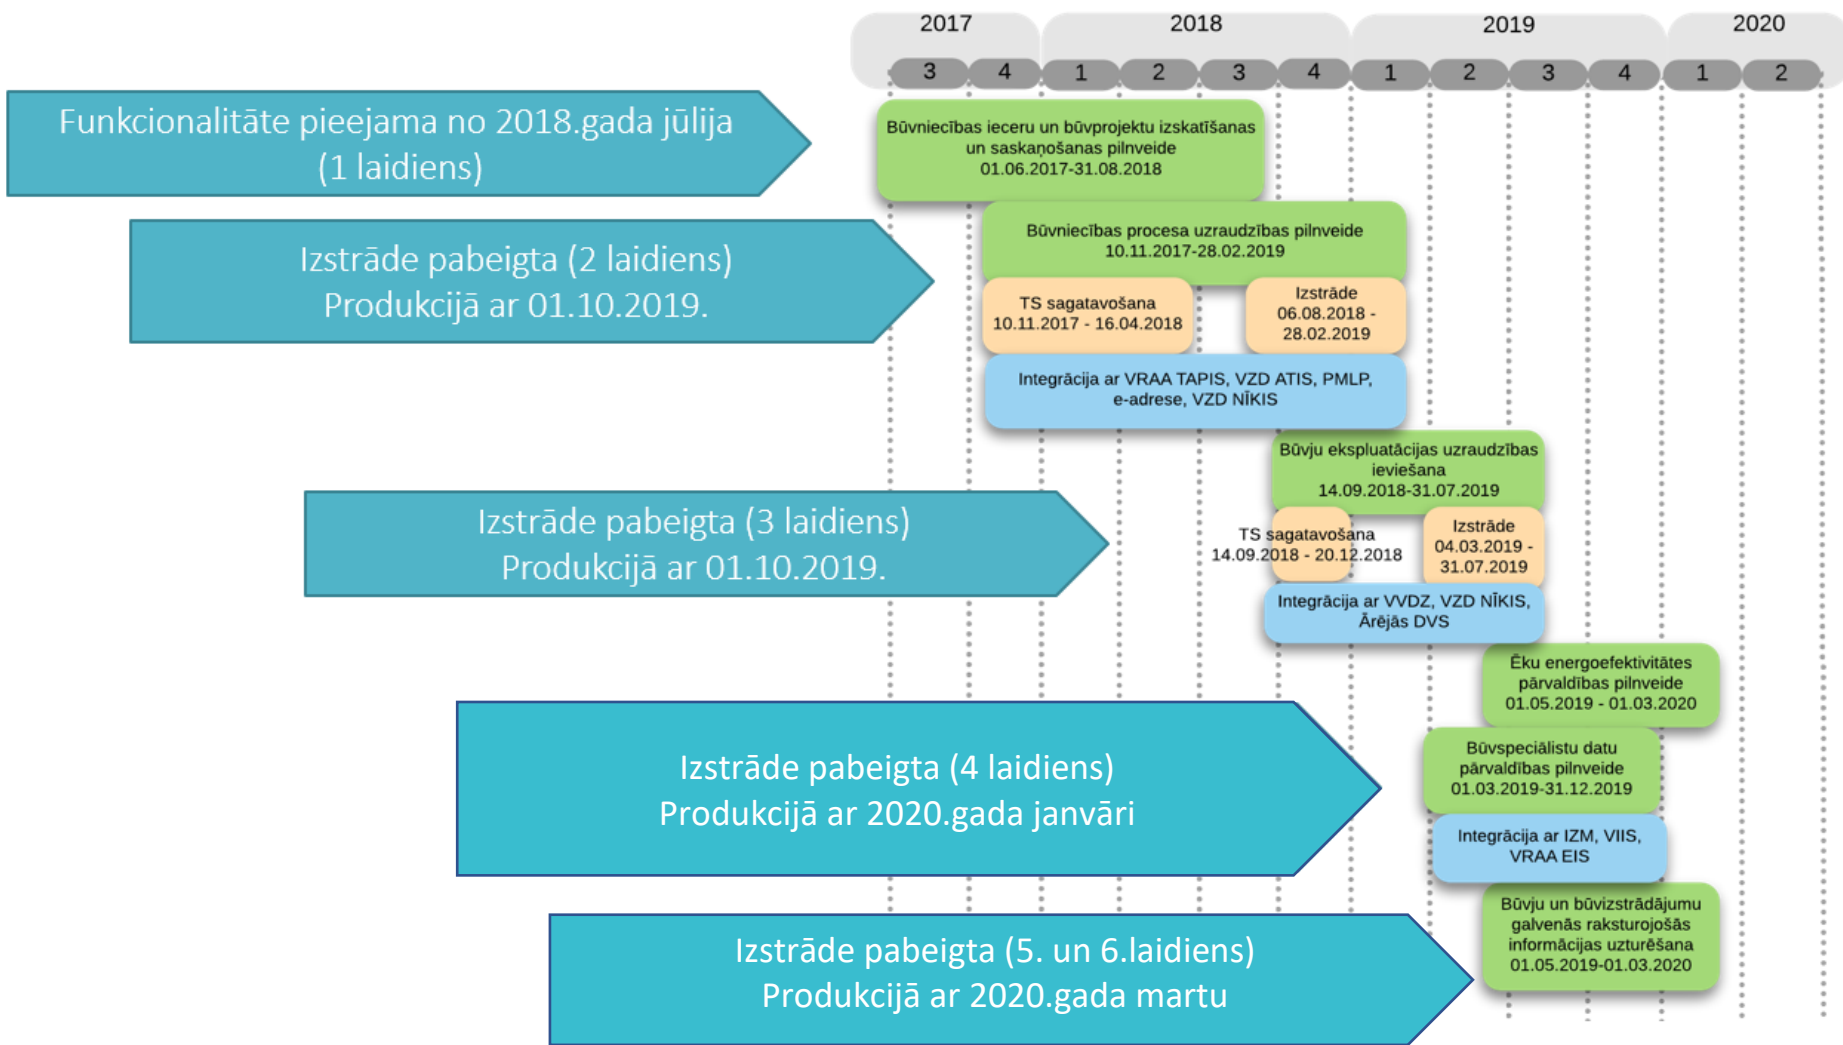

## 9. Progresā informācija un materiāli:

Informācija par projekta progresu Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā -

<http://bvkb.gov.lv/lv/content/eiropas-regionalas-attistibas-fonda-erap-projekti>

Apmācību materiāli pieejami:

- <http://bvkb.gov.lv/lv/content/informativie-seminari>;
- [https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqalJBLz2QWCreamvHA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqalJBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber)

Vebināru ieraksti:

<https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDEvMjEvMXNibzdyZGY5cF9QYW1hY2liYXMucGRml1d/Pamacibas.pdf>

## BIS lietotāju informatīvie un atbalsta materiāli:

- Informatīvs buklets

[http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/bis\\_brosura\\_2019.pdf](http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/bis_brosura_2019.pdf)

- Informatīvais materiāls projektētājiem

[https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvNmw1OHBsNWljNV9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX3Byb2pla3RldGFqaWVtLnBuZyJdXQ/BIS\\_Info\\_grafika\\_projektetajiem.png](https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvNmw1OHBsNWljNV9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX3Byb2pla3RldGFqaWVtLnBuZyJdXQ/BIS_Info_grafika_projektetajiem.png)

- Informatīvais materiāls būvniekiem

[https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvMXJieWZreWIwOF9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX2J1dm5pZWtpZW0ucG5nIl1d/BIS\\_Info\\_grafika\\_buvniekiem.png](https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvMXJieWZreWIwOF9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX2J1dm5pZWtpZW0ucG5nIl1d/BIS_Info_grafika_buvniekiem.png)

- Informatīvie materiāli tehnisko noteikumu izdevējiem

[https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvM2h5ZjQzcHp5Nl9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX1ROSS5wbmciXV0/BIS\\_Info\\_grafika\\_TNI.png](https://bis.gov.lv/bisp/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTEvMTMvM2h5ZjQzcHp5Nl9CSVNfSW5mb19ncmFmaWthX1ROSS5wbmciXV0/BIS_Info_grafika_TNI.png)

Seko jiet līd z ar ī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:

Facebook lapā <https://www.facebook.com/bvkbly>

Youtube kontā

[https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqalJBLz2QWCreamvHA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqalJBLz2QWCreamvHA?view_as=subscriber)

Twitter kontā <https://twitter.com/BBirojs>

## 10. Kontaktinformācija:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informāciju sistēmu departaments

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas

Projekta vadītāja Aija Vule

[Aija.Vule@bvkb.gov.lv](mailto:Aija.Vule@bvkb.gov.lv)

Tel.: +371 67013311
