

Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta
“**Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta**”
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)
īstenošanas statusu

Projekta nosaukums: Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta

Projekta ieviešanas periods: 26.11.2019. – 25.11.2022.

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs

Projekta partneri: EM, VZD, TA, PMLP, ZMNĪ, LNA, LVĢMC, VRAA

Ziņojums par periodu: 01.04.2021. – 30.06.2021.

1. Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis	Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta mērķis	<p>1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.</p> <p>2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.</p> <p>3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.</p> <p>Projekta mērķis ir BIS pilnveidošana, ieskaitot procesu optimizācijas un automatizācijas turpināšanu (pēc 1.kārtā veiktajiem procesu pilnveides darbiem) (ieceres iesniegšanas, saskaņošanas, būvniecības procesa kontroles, nodošanas un ekspluatācijas stadijām sistēmā), administratīvā sloga ietekmes mazināšana, automatizēta analītisku lēmumu pieņemšanas rīka (aģenta) izveide, un sistēmas uzlabošana, lai tā būtu vienota platforma jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai no ieceres līdz ekspluatācijas beigām, kā arī pamats Būves informācijas modelēšanas (turpmāk – BIM) procesu ieviešanai Latvijā un nodrošinātu nepieciešamo platformu no valsts informācijas sistēmas puses. BIM iespēju īstenošana BIS ietvaros ir projekta pamatievīrze un katras problēmjas risinājums ir daļa, kas veicina un īsteno BIM kopējo procesu – tas ir, katrs risinājums veido kopīgu centralizētu platformu BIM procesa ieviešanai.</p>



2. Projekta ieviešanas gaita

Projekta aktiv. Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts	Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1.	Projekta vadība un īstenošana	Īstenots projekts		<ul style="list-style-type: none"> - Projekta ietvaros kopā notikušas 4 (no tām pārskata periodā 1) Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 4 (no tām pārskata periodā 1) Projekta valdes sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 72 (no tām pārskata periodā 21) Projekta vadības darba grupas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 72 (no tām pārskata periodā 23) projekta komandas sēdes. - Projekta ietvaros kopā notikušas 59 (no tām pārskata periodā 33) projekta darba grupas. - Projekta ietvaros kopā sagatavoti 5 (no tiem pārskata periodā 1) Maksājumu pieprasījumi.
2.	Konsultācijas pakalpojumu sniegšana			
2.1.	Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un pārvaldība	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar SIA "AA Projekts" par Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ERAF projekta "Būvniecības procesu un



	elektroniskā kopdarbības vidē			informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" plānoto darbību īstenošanai. Darbība ir uzsākta pirms projekta īstenošanas un sagatavoti dokumenti uz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi. Izstrādāts Detalizētais projekta apraksts. Izstrādāts Izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments. Dokumenti izstrādāti. Aktivitāte ieviesta.
2.2.	Informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma Tehniskās specifikācijas izstrāde	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Tehniskā specifikācija izstrādāta. Iepirkums noorganizēts, sniegts atbalsts iepirkuma norises laikā un BIS funkcionalitātes pilnveides darbus veiks SIA Tieto Latvia. Aktivitāte ieviesta.
2.3.	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole	Nodrošināta kvalitātes kontrole un dokumentācijas izstrādes pakalpojums		
2.3.1.	Būvniecības procesu pilnveides tehnisko specifikāciju izstrāde un biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde	Izstrādātas 7 gb. Tehniskās specifikācijas	4 gb.	Līdz šim izstrādātas: 1) 1.laidiena tehniskā specifikācija "Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide" (1 gb.) 2) 2.laidiena tehniskā specifikācija "Būvniecības process – 1.daļa" (1.gb.) 3) 3.laidienam tehniskā specifikācija "Ekspluatācija – 1.daļa". 4) 4.laidienam tehniskā specifikācija "Būvniecība – 2.daļa".



				Pārskata periodā: 5) Uzsākta tehniskās specifikācijas izstrādes 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa”.
2.3.2.	Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole	Veikta informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole (36 mēneši)	16 ziņojumi	Līdz šim projekta ietvaros organizētas 72 sanāksmes informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 10 sanāksmes. Sagatavoti 16 ziņojumi par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, no tiem 2 ziņojumi pārskata periodā.
3.	Informācijas sistēmas pilnveide			
3.1.	Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide	Pilnveidots Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process (1 gab.). Izstrādāti/pilnveidoti e-pakalpojumi (4 gab.): •Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana •Trešo personu saskaņojuma saņemšana •Piekļuve būvniecības lietai •Tehnisko noteikumu pieprasīšana	Daļēji pilnveidots process. Izstrādāts e-pakalpojums Piekļuve būvniecības lietai.	2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Tieto Latvia par BIS funkcionalitātes pilnveides un uzturēšanas darbiem. 2.laidiena ietvaros nodrošināta: - pieprasījuma iesniegšana piekļuvei pie būvniecības lietas, pieprasījumu un pieejamo būvniecības lietu pārvaldīšana BISP autorizēta lietotāja darba vietā. - Pilnveidots detalizētā projekta rasējuma saskaņošanas process. - Automatizēts tehnisko noteikumu pieprasīšanas process – izmantojot ATIS datus sistēma informē lietotāju par tehnisko noteikumu nepieciešamību.



				<p>Uzsākts darbs pie 4.laidiena “Būvniecība – 2.daļa” funkcionalitātes pilnveides, kuras ietvaros šim procesam tiks veikti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trešo personu identificēšana, saskaņojuma pieprasīšana un saņemšana (būvniecības procesā).
3.2.	Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide	<p>Pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). Pilnveidots epakalpojums: 1) Sūdzību iesniegšana (1 gab.) Atvērto datu kopas: 1) Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) (1 gab.). 2) Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija (1 gab.).</p>	Daļēji pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). attiecībā uz iespēju realizēt būvniecības procesu pa kārtām.	<p>Veiktas funkcionalitātes pilnveides un pieejama produkcijā ERAF 2.kārtas 2 laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” pilnveidojumi ar 2021.gada janvāri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nodrošināta iespēja realizēt iecerī pa būvniecības kārtām. - Izveidota iespēja Būvinspektoram veidot pārbaužu grafikus. - Pilnveidota darba uzdevumu funkcionalitāte, kā arī papildināta būvdarbu žurnāla funkcionalitāte
3.3.	Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide	<p>Pilnveidots Būvju ekspluatācijas uzraudzības process (1 gab.). un izstrādāts epakalpojums - Būves ekspluatācijas lieta (1 gab.).</p>		<p>Turpinās 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides.</p> <p>Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita.</p>
3.4.	Būvkomersantu datu pārvaldības procesa pilnveide	<p>Pilnveidots Būvkomersantu datu pārvaldības process (1 gab.). pilnveidots epakalpojums – Dati</p>		<p>Uzsākts 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību</p>



		no būvkomersantu reģistra (1 gab.).		definēšanas un funkcionalitātes pilnveides. Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita .
3.5.	Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Izstrādāta, saskaņota un ieviesta produkcijā BIS 2.kārtas 1.laidiena “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide” funkcionalitāte. <i>Funkcionalitāte produkcijā, aktivitāte ieviesta.</i> Papildus Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa ietvaros 4.laidienā “Būvniecības process – 2.daļa” plānots izstrādāt jaunu datu apmaiņas komponenti VEDLUDB datu izgūšanai. Esošo BIS sistēmas daļu un komponentu (BIS2, BISP) pilnveide, lai nodrošinātu izgūto un apstrādāto datu izmantošanu esošajos būvniecības procesos.
3.6.	Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas (2 gab.): - energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati; - ekspluatācijā	Pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas (2 ga.): - energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati;	Uzsākts 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides. Funkcionalitātes pilnveidēs tiks ietverts:



		nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati.	- ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati.	<ul style="list-style-type: none">- Energosertifikācijas process un Sadaļas (datu bloki) Energosertifikāta izveidei;- Ēkas energosertifikāta izveide;- Ēkas pagaidu energosertifikāta izveide. <p>Turpinās darbs pie 5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” tehniskās specifikācijas izstrādes, kura ietvaros plānots veikt Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa pilnveidi un publicēt divas atvērto datu kopas.</p>
3.7.	Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide	Pilnveidots Apziņošanas un informēšanas process (1 gab.). Pilnveidots e-pakalpojums: Atgādinājumu saņemšana (1 gab.).	Daļēji realizēts process attiecībā uz 1. un 2. laidiena procesu pilnveidojumiem.	<p>1. un 2 laidienu ietvaros ir izveidoti vairāki paziņojumi/brīdinājumi pilnveidoto procesu atbalstam, t.sk. paziņojumi par piekļuvi attiecīgai lietai un par izmaiņām detalizētā projekta rasējuma lapu skaņošanas procesā. Veikta BIS mājas lapas esošās informācijas pieejamības izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā". Pati mājas lapa nodalīta no BIS iekšējā portāla.</p> <p>3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” ietvaros plānots veikt pilnveidojumus: 1) Atgādinājumu saņemšana: - Pārvaldnieku paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem;</p>



				<ul style="list-style-type: none">- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana par būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas neveikšanu;- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam par izmaiņām pārvaldnieku reģistra datos;- Uzraugošo iestāžu paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam. <p>2) Apziņošanas un informēšanas procesa ietvaros:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lietotāja atbalsta pilnveidošana - attālināta piekļuve lietotāja kontam, konsultāciju nodrošināšanai un pieteikumu risināšanai;- Vienotas datu izdrukas sagatavošana BIS. <p>4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros veicamie pilnveidojumi:</p> <p>1) Pilnveidots e-pakalpojums</p> <p>Atgādinājumu saņemšana, kas ietver:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paziņojumu izsūtīšana sūdzības iesniedzējam par to, ka sūdzība novirzīta citai iestādei;- Brīdinājumi un paziņojumi, kas saistīti ar VEDLUDB datu izmantošanu būvniecības uzraudzības procesā būvobjektā;- Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie paziņojumi.
--	--	--	--	--



				<p>2) BIS arhivējamo dokumentu papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā izveidoto dokumentu numuru veidošanu saskaņā ar nomenklatūru.</p> <p>3) Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru:</p> <ul style="list-style-type: none">- Būvniecības lietas datu nodošana (gan informāciju, gan dokumentus attiecībā uz nekustamo īpašumu vai zemes gabalu);- Būvprojektu un Ietekmes uz vidi novērtējuma datu nodošana (apbūves tiesību gadījumā).
3.8.	Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide	Izstrādāts būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites process		<p>Uzsākts 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides.</p> <p>4.laidiena ietvaros Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveides ietvaros tiks izveidota BIS funkcionalitāte Būvniecības atkritumu izvešanas no būvlaukuma trasējamības kontrolei:</p> <ul style="list-style-type: none">- Atkritumu uzskaites žurnāla funkcionalitātes izstrāde - būvdarbu žurnāla papildinājumi ar atkritumu uzskaiti (būvniecības atkritumu datu savietošana ar BIS esošajiem būvobjektiem un būvkomersantu datiem);



				<ul style="list-style-type: none"> - Certificēto būvniecības atkritumu izvedēju datu attēlošana; - Pārskatu izveides/attēlošanas iespējas par būvniecības atkritumu pārvaldījumiem un utilizācija; - Informācijas filtrēšana pa reģioniem, pa būvlaukumiem (pēc adreses vai īpašuma kadastra numura, ja tiks nodrošināti attiecīgie dati); - Konkrētu pārvaldījumu datu sasaiste ar būvobjektiem. <p>Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita.</p> <p>Izstrāde līdz 2021.gada beigām.</p>
3.9.	Administratoru un BIS lietotāju apmācības, t.sk. atbalsta materiālu izstrāde.	Apmācīti 700 BIS administratori un lietotāji par jaunizveidoto funkcionalitāti. Izstrādāti 8 pilnveidotajiem/izveidotajiem būvniecības procesiem apmācību, atbalsta un lietotāju materiāli, t. sk. interaktīvi materiāli un rokasgrāmatas.	1300	<p>Kopumā ERAF projektā par jaunizstrādāto funkcionalitāti organizēti 34 tiešsaistes apmācību pasākumi, apmācot 1300 lietotājus.</p> <p>Pārskata periodā nav bijušas projekta apmācības.</p>
4.	IS ieviešanas kvalitātes kontrole (audits)	4 Audīta ziņojumi	1	<p>Iepriekšējā pārskata periodā veikts drošības audīts visiem BIS moduļiem un saskarnēm pēc 2.laidiena ieviešanas produkcijā.</p> <p>Šajā pārskata periodā nav bijuši drošības auditi.</p>



5.	Publicitāte	Preses relīzes	3	<p>Izgatavots informatīvs plakāts par projektu. Izvietots BVKB Kancelejā, K.Valdemāra ielā 157, Rīga, klientiem un iedzīvotājiem labi pieejamā un pārredzamā vietā.</p> <p>Izveidota sadaļa informācijas publicēšanai par ERAF 2.kārtas projekta ieviešanas gaitu BIS portālā: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta</p> <p>Pārskata perioda publikācijas: 1. Publikācija I ceturkšņa būvvalžu sanāksme (14.04.2021.) https://www.bis.gov.lv/news/i-pusgada-buvvalzu-sanaksme</p> <p>2. Publikācija Aicinām noklausīties vebināru "Būvdarbu žurnāls BIS" (10.05.2021.) https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-noklausities-vebinaru-buvdarbu-zurnals-bis</p> <p>3. Publikācija Informācijas BIS mājas lapā</p>
----	-------------	----------------	---	--

				"3 laidiena "Ekspluatācijas process" akcepttestēšanas demonstrācija" (12.05.2021.) https://www.youtube.com/watch?v=tk36joGRWcQ
--	--	--	--	---

3. Projekta 3.laidiena izstrāde

Pabeigta 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” funkcionalitātes izstrāde.

Laidiena ietvaros organizēti 4 sprinti.

Sīkāka informācija: <https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.

Veiktās pilnveides:

- ✓ Pilnveidota Būvkomersantu datu pārvaldība – izstrādāta VID-BIS saskarne automatizētai datu nodošanai par finanšu pārskatiem būvkomersantu klasifikācijai;
- ✓ Būves ekspluatācijas lietas pilnveidošana, t.sk. mājas lietas izveidošana;
- ✓ Ar ēkas tehnisko uzturēšanu saistīti dokumenti;
- ✓ Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi, t.sk. reģistrēšanās pakalpojuma pilnveide;
- ✓ Brīdinājumu, paziņojumu izsūtīšana pārvaldniekiem un īpašniekiem;
- ✓ Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide.

Funkcionalitātes piegāde produkcijā plānota 2021.gada beigās.

4. Projekta 4.laidiena izstrāde

Izstrādāta un saskaņota 4.laidiena “Būvniecības process 2.daļa” tehniskās specifikācija un izstrāde tiks uzsākta šī gada aprīlī. Laidiens tiks sadalīts 6.sprintos un plānots veikt funkcionalitātes pilnveides sekojošās tēmās:

- ✓ ***Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaitē.*** Plānots izstrādāt būvgružu pārvadājumu datu BIS un APUS integrāciju, lai atvieglotu būvniecības procesa kontroles iestāžu darbu- BIS un APUS sistēmu integrācija nodrošinās efektīvāku atkritumu utilizācijas un par to atbildīgo personu uzraudzību, kā arī veicinās būvniecības atkritumu savācēju un pārstrādātāju godprātību.
- ✓ ***Trešo pušu saskaņojumi.*** Plānots izstrādāt risinājumu, kas nodos ieceres iesniedzējam sarakstu ar personām (trešo pušu identificēšana), ar ko iespējams veikt saskaņošanu BIS un ar kurām ārpus BIS (nosūtot ieceres saskaņošanas pieprasījumu uz e-adresi), tādējādi atvieglot darbu arī būvvaldēm.
- ✓ ***Datu apmaiņas servisa pilnveide ar PMLP.*** Tiks veikta BIS datu apmaiņas saskarnes pilnveide ar PMLP, nodrošinot vienota Latvijas iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra izmantošanu.
- ✓ ***Meliorācijas objektu būvniecības procesa elektronizēšana.*** Tiks veikta integrācijas izveide ar ZMNĪ uzturēto Meliorācijas kadastra IS datu nodošanai un saņemšanai BIS, lai elektronizētu meliorācijas objektu būvniecības procesu.
- ✓ ***Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru (ILR).*** Tiks veikta BIS un ILR integrācija, nodrošinot pilnu būvniecības lietas un ekspluatācijas lietas datu apjoma nodošanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

- ✓ **Būvniecības procesa uzraudzības un būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide.** Plānots realizēt VEDLUDB datu sasaisti ar būvspeciālistu datiem, lai uzraugošajām institūcijām nodrošinātu būvspeciālistu pārraudzību.
- ✓ **Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide.** T.sk. būvdarbu žurnāla funkcionalitātes uzlabojumi; apziņošanas un informēšanas uzlabojumi; inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizēšanai.
- ✓ **Unificētās saskarnes pilnveide.** Unificētās saskarnes pielāgošana universālajai pašvaldības darba vietai nodrošinās autentifikāciju BIS, izmantojot pašvaldības informācijas sistēmas lietotāja autentifikācijas parametrus, pie nosacījuma, ka lietotājs autentificējies ar vienoto pieteikšanās moduli Latvija.lv.
- ✓ **BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju.** BIS datu nodošanu uz ILR, tiks realizēta caur VISS.
- ✓ **Integrācija ar VVAIS.** BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām.
- ✓ **Integrācija BIS-TAPIS papildinājuma izstrāde.**



Sīkāka informācija par plānotajām darba grupām, sprintu tēmām un informācija dalībai tajās:

<https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.



5. Projekta 5.laidiena izstrāde

Uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa”.

Tehniskā specifikācija tiks izstrādāta līdz 2021.gada augustam.

6. Papildus funkcionalitāte, kas ieviesta pārskata periodā

6.1. IZMAIŅAS, KAS SAISTĪTAS AR TERITORIĀLĀS REFORMAS IEVIEŠANU

2021. gada jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā sāks darboties 43 pašvaldības. Minētās izmaiņas neietekmēs lietu virzību BIS. Ja konkrētajam objektam adrese būs mainījies, tā automātiski tiks nodota atbildīgajai būvvaldei un īpašniekam pašam nekādas papildu darbības nebūs jāveic.

2021.gada 1.jūlijā stājas spēkā nosacījumi, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu, tas skars arī būvvaldes un būvniecību lietu administrēšanu BIS.

Gatavojoties reformai, BVKB veicis būvvalžu aptauju jaunizveidojamo pašvaldību administratīvo teritoriju būvvaldēs, piedāvājot izvēlēties vienu no variantiem attiecībā par būvvaldēs esošo BIS datu migrāciju no reorganizējamās būvvaldes uz jaunizveidojamo būvvaldi. Lielākā daļa (79%) izvēlējās variantu, kad jaunizveidotajās administratīvajās teritorijās esošās būvvaldes tiek apvienotas, veidojot vienu struktūrvienību.


Balstoties uz iegūto informāciju, BVKB pieņēmis lēmumu ar 2021.gada 1.jūliju BIS apvienot visas jaunizveidotajā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās būvvaldes, pievienojot reorganizējamo būvvalžu kontus (ar visām būvniecības lietām, uzdevumiem un lietotājiem) jaunizveidotās pašvaldības būvvaldes kontam (turpmāk – atbildīgā būvvalde).

Šajā datu migrācijas procesā lietotāju tiesības tiks saglabātas līdzšinējā apjomā ar vienu izņēmumu - BIS administratora tiesības tiks saglabātas tikai atbildīgās būvvaldes administratoram. Tāpēc atbildīgās būvvaldes administratora pienākums ar 2021.gada 1.jūliju aktualizēt būvvaldes darbinieku tiesību apjomu, nokonfigurēt darba uzdevumus un lietotāju grupas atbilstoši jaunai struktūrai. Kā arī reorganizējamo pašvaldību struktūrvienību tehnisko noteikumu izdevēju konti BIS tika pievienoti jaunizveidotajā pašvaldībā tehnisko noteikumu izdevēju kontā, saglabājot esošo lietotāju struktūru, tiesības, nosaukumu, darba uzdevumus.

7. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks

Nākamajā periodā (2021.gada III.ceturksnis) plānots turpināt funkcionalitātes pilnveides 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros un pabeigt darbu pie 5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” tehniskās specifikācijas izstrādes.

Aktivitāšu ieviešanas grafiks

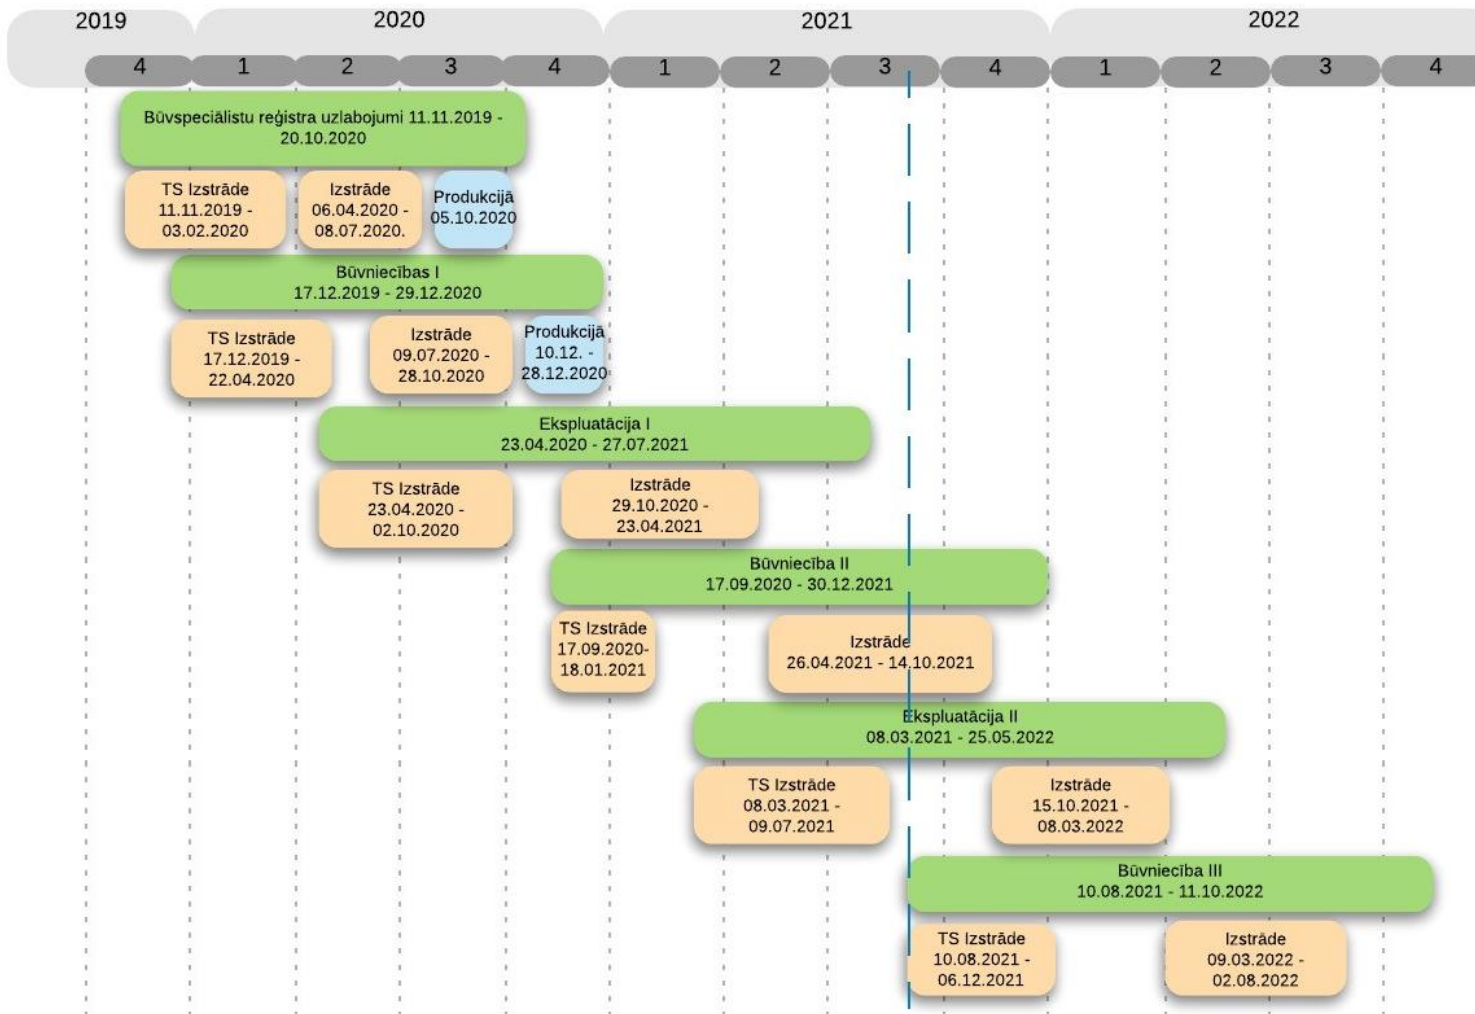

8. Progresā informācija un materiāli:

Informācija par projekta progresu Būvniecības informācijas sistēmas portālā -
<https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta>

Līdz šim izstrādātie apmācību materiāli pieejami:

- <https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-informativie-pasaku-mi-un-macibas>
- <https://www.bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas>
- <https://www.youtube.com/watch?v=h2LGao477Ww&list=PLrziCjRWpPuthiwshn7okF8iEvcyuePYM>

Sekoiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:
Facebook lapās:

<https://www.facebook.com/bvkbly>

<https://www.facebook.com/bislv>

Youtube kontā:

https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaljBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber

Twitter kontā: <https://twitter.com/BBirojs>

10. Kontaktinformācija:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informāciju sistēmu departaments

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļa

Projekta vadītāja Aija Vule

Aija.Vule@bvkb.gov.lv

Tel.: +371 20259623
